PYRAMID

Resultatuppföljning

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.0 - (100212)

Handbok för tillvalsmodul Resultatuppföljning Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

februari 2010

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se


resultat.* • 12/2 2010 • dok/aj

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid RESULTATUPPFÖLJNING **4**
Periodrapport (RUPE) 5
Projektrapport (RUPO) 6
Efterkalkyl (RUKA) 7
Pågående arbete (RUPI) 8
Arbetsplatsrapport (RUAR) 9
Rapporteringslista (RLIS) 10

Pyramid RESULTATUPPFÖLJNING

Resultatuppföljning är en tillvalsmodul för avancerad uppföljning av såväl enskilda projekt som uppföljning per avdelning. Listorna finns i rutin 8020 Utskriftscentralen, mappen Resultatuppföljning.

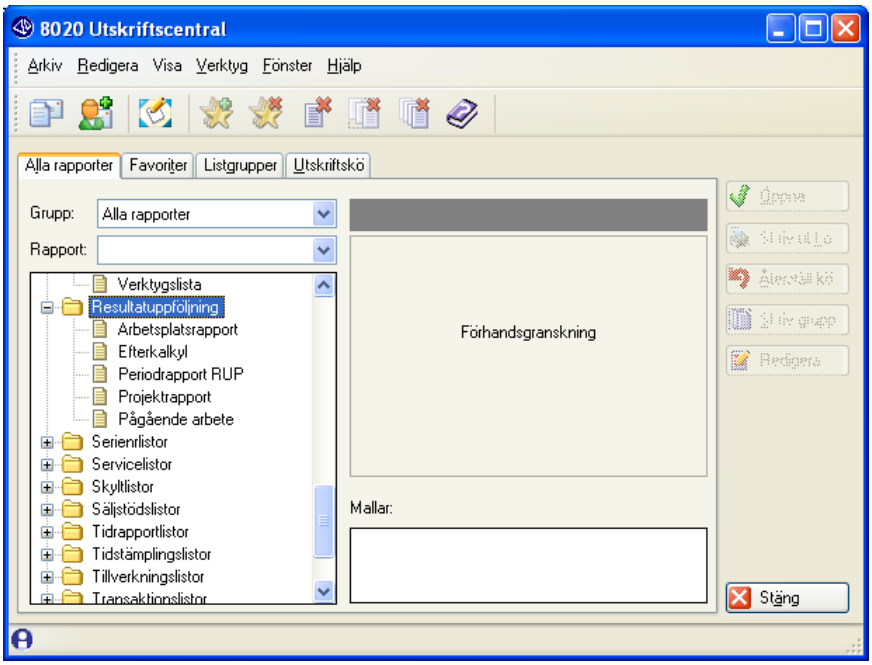

Periodrapport (RUPE)

FRÅN ORDERNR: 860 AVDELNING: FRÅN DATUM:
TILL ORDERNR: 860 ENDAST ANBUD: N BUDGETJÄMF.: TILL DATUM:

ORDERNR	TYP	AV-SLUT	PERIODENS KOSTNAD	TIM	RAPPORTERAD INTÄKT	TIM	DIFFERENS	PERIODENS FAKTURERING
860	P	N	2,600	2	21,000	2	18,400	0
SUMMA PERIODEN			2,600	2	21,000	2	18,400	0
BUDGET PERIODEN					0			0
DIFF BUDGET					0			0
DIFF BUDGET (%)								

DIFF TIMMAR INTÄKT-TIMMAR	KOSTNAD	0	
RAPPORTERAT TB PERIODEN.....	...	18,400	88
RAPPORTERAT TB/TIMME.....	...	9,200	
FAKTURARESERV.....	...	-21,000	

Periodrapporten ger dig per projekt, per avdelning eller för företaget totalt vad rapporterats under vald period. För varje projekt kan du se periodens kostnad och vad som rapporterats som debiterbart. Du kan också se vad som blivit fakturerat under perioden.

I listan tas för projekt av typen ”Fast pris” hänsyn till om budgeterade värden överskridits vid rapporteringen.

Periodens förändring av fakturareserven beräknas på rapporterat debiterbart minskat med faktureringen.

Projektrapport (RUPO)

FRÅN ORDERNR:	860	AVDELNING:	
TILL ORDERNR:	860	ENDAST ANBUD:	N

ORDERNR	KUNDKOD	KUND			AVSLUTAT	PROJEKTNAMN	
KALKYLTYP/BENÄMNING			ANTAL	KOSTNAD	ÅTERSTÅR	INTÄKT	ÅTERSTÅR
860	BRAAB	Bröderna Andersson Mek AB			N	Fastpris	
INKÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER							
Budget.....				24,000		30,000	
Rapporterat.....				2,000	22,000	20,000	10,000
EGET MATERIAL							
Budget.....				800		1,000	
Rapporterat.....				0	800	0	1,000
UPPARBETAD TID							
Budget.....			50	15,000		25,000	
Rapporterat.....			2	600	14,400	1,000	24,000
TRANSPORTER							
Budget.....				500		2,000	
Rapporterat.....				0	500	0	2,000
SUMMA BUDGET			50	40,300		58,000	
SUMMA RAPPORTERAT			2	2,600	37,700	21,000	37,000
ÅTERSTÅR TIMMAR			48				
DELFAKTURERAT						0	58,000
PÅGÅENDE ARBETE						21,000	
SUMMA BUDGET			50	40,300		58,000	
SUMMA RAPPORTERAT			2	2,600	37,700	21,000	37,000
ÅTERSTÅR TIMMAR			48				
DELFAKTURERAT						0	58,000
PÅGÅENDE ARBETE						21,000	
BUDGET TÄCKNINGSBIDRAG						17,700	30.5 %
RAPPORTERAT TÄCKNINGSBIDRAG						18,400	87.6 %
BUDGET TB/TIMME						354	
RAPPORTERAT TB/TIMME						9,200	

Projektrapporten är avsedd att regelbundet tas fram för att kontrollera status för pågående projekt. Utmärkt att ha som underlag vid exempelvis projektmöten.

Efterkalkyl (RUKA)

FRÅN ORDERNR:	860	AVDELNING:	
TILL ORDERNR:	860	ENDAST ANBUD:	N

ORDERNR	KUNDKOD	KUND		AVSLUTAT	PROJEKTNAMN	
KALKYLTYP/BENÄMNING		BUDGET INTÄKT	RAPPORT INTÄKT	RAPPORT KOSTNAD	RAPPORT TB KR	AVVIKELSE PROCENT
860	BRAAB	Bröderna Andersson Mek AB		N	Fastpris	
Inköpta varor och tj		30,000	20,000	2,000	18,000	-33.3
Eget material		1,000	1,000	100	900	0.0
Upparbetad tid		25,000	1,000	600	400	-96.0
Transporter		2,000	4,000	1,000	3,000	100.0
SUMMA		58,000	26,000	3,700	22,300	
FAKTURERAT			0			
TIMMAR BUDGET	50					
TIMMAR RAPPORTERAT	2			TÄCKNINGSGRAD:	85.8	

					TB%
SUMMA RAPPORTERAT:	58,000	26,000	3,700	22,300	85.8
BUDGET TB				17,700	30.5
FAKTURERAT		0			
BUDGET TB/TIM	354				
FAKTURERAT TB/TIM	-1,850				
BUDGET RESULTAT				0	0.0
RESULTAT				0	0.0

Efterkalkylen visar per kalkyltyp procentuell avvikelse från budget. I foten kan du även se fakturerat täckningsbidrag per timme rapporterad tid. Budgeterat resultat och fakturerat resultat i kronor och procent finns tillgängligt.

Pågående arbete (RUPI)

FRÅN ORDERNR:	860		AVDELNING:		PER DATUM:
TILL ORDERNR:	860		PROJEKTTYP:		BUDGETJÄMFÖRELSE:

ORDERNR	KUNDKOD	KUND	PROJEKTNAMN	ANSV
KALKYLTYP/BENÄMNING		TIMMAR	KOSTNAD	INTÄKT
860	BRAAB	Bröderna Andersson Mek AB	Fastpris	
INKÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER			2,000	20,000
EGET MATERIAL			100	1,000
UPPARBETAD TID		2	600	1,000
TRANSPORTER			1,000	4,000
SUMMA RAPPORTERAT		2	3,700	26,000
ANBUDSSUMMA				58,000
FAKTURERING			0	0
PÅGÅENDE ARBETE			-3,700	-26,000
SUMMA RAPPORTERAT		2	3,700	26,000
FAKTURERING			0	0
PÅGÅENDE ARBETE			-3,700	-26,000

Pågående arbete värderat både till kostnad och intäkt. Det senare avsett för den interna redovisningen. Hänsyn tas även till projekt av typen ”Fast pris”.

Arbetsplatsrapport (RUAR)

FRÅN ORDERNR:	860	ANSVARIG:		FRÅN DATUM:	
TILL ORDERNR:	860	PROJEKTTYP:		TILL DATUM:	

ORDERNR	KUNDKOD	KUND	PROJEKTNAMN		ANSV
KALKYLTYP/BENÄMNING			PERIODENS RAPPORTERING	ACKUMULERAD RAPPORTERING	ÅTERSTÅR
860	BRAAB	Bröderna Andersson Mek AB	Fastpris		
INKÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER			20,000	20,000	10,000
EGET MATERIAL			1,000	1,000	0
UPPARBETAD TID			1,000	1,000	24,000
TRANSPORTER			4,000	4,000	-2,000
SUMMA RAPPORTERAT			26,000	26,000	32,000
SUMMA FAKTURERAT			0	0	58,000
FAKTURERAT - RAPPORTERAT				-26,000	
SUMMA TIMMAR			2	2	48

SUMMA RAPPORTERAT	26,000	26,000	32,000
SUMMA FAKTURERAT	0	0	58,000
FAKTURERAT - RAPPORTERAT		-26,000	
SUMMA TIMMAR	2	2	48

Här kan du per kalkyltyp se vad som rapporterats till ett visst projekt för en viss period. Du ser även vad som rapporterats totalt och vad som återstår av budget.

Rapporteringslista (RLIS)

ORDERNR:	860	FRÅN ARTIKEL:	FRÅN DATUM:
KATEGORI:	2	TILL ARTIKEL:	TILL DATUM:

KUND / ARTIKELKOD	SIGN	BENÄMNING	DATUM / PROJEKTNAMN	BUDGET/ DATUM	RAPPORT. ANTAL		ANSVARIG / KOSTNAD
Bröderna Andersson Mek AB			090706 Fastpris				
TRANSP		Transport		1	2		1,000
	AJ	Transport		090706		2	1,000
SUMMA RAPPORTERAT				2,000	0		1,000
BUDGET TIMMAR					0		

Rapporteringslistan visar i detalj vad som blivit rapporterat under begärd kalkyltyp.
